



Kontenery
Budownictwo modułowe

2.2

Domachowo, 06.03.2018 r.

Pan Piotr Grudziądź

Lew Lębork

Oferta nr 08/03/2018

OBIEKT SZATNIOWO-SANITARNY

| Wymiary pojedynczego kontenera [mm] | | Wymiary zewnętrzne | Wymiary wewnętrzne |
|--|--|--------------------|--------------------|
| | Dł. | 6058 | 5898 |
| | Szer. | 2438 | 2278 |
| | Wys. | 2800 | 2500 |
| Konstrukcja ramy | Rama wykonana z profili stalowych zimnogiętych, spawana, zabezpieczenie antykorozyjne (+- 100 µm): podkład, dwuskładnikowa farba poliuretanowa | | |
| Podłoga | Rama stalowa zamknięta blachą trapezową, wełna mineralna 100 mm, folia paroizolacyjna, płyta OSB wodoodporna 22 mm, wykładzina PCV przemysłowa | | |
| Dach | Blacha stalowa ocynkowana, wełna mineralna 100 mm, folia paroizolacyjna, płyta wiórowa podwójnie laminowana | | |
| Ściany | Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR 60 mm, pokryta warstwą ochronną poliester 25 µm, obróbki blacharskie | | |
| Drzwi | Drzwi zewnętrzne stalowe pełne o wymiarach 900 x 2000 mm, z klamką i wkładką patentową – 5 szt., drzwi wewnętrzne o wymiarach 900 x 2000 mm – 3 szt | | |
| Okna | Rozwierno-uchylne z roletą zewnętrzną, 800x1100 mm, profil PCV - 3 szt; luzciki w modułach sanitarnych – 3 szt | | |
| Instalacja elektryczna | Przewody w korytach kablowych, tablica elektryczna z wyposażeniem, 2 podwójne oprawy LED z wyłącznikami, 2 podwójne gniazda wtykowe, grzejnik elektryczny 2000 W – 1 | | |

www.boxtainer.pl biuro@boxtainer.pl

tel. +48 512 517 342, tel./fax: +48 58 322 09 07

Tenistal Sp. z o.o. Sp. k. ul. Leszka Białego 21; 80-353 Gdańsk, Polska

NIP: PL 5842734515; REGON 221990342; KRS 0000486218; Bank PEKAO S.A. 62 1240 1271 1111 0010 6208 7529

Adres korespondencyjny:

Tenistal Sp. z o.o. Sp. k. Domachowo 19; 83-041 Mierzeszyn

| | |
|-----------------------------|---|
| | szt. |
| Kolorystyka | Ściany zewnętrzne w kolorze antracytowym RAL 7016, ściany wewnętrzne w kolorze białym RAL 9010, rama w kolorze jasnoszarym RAL 7001 |
| Wypożyczenie wnętrza | Moduły WC: - 2 x kabina kompakt WC - 2 x bojler - 2 x lufcik - 2 x wentylator |

Cena łącznie: 64.200 zł netto

Cena montażu: 1.500 zł netto

* Wszystkie podane ceny są cenami EXW Domachowo (nie zawierają transportu).

* Cena nie obejmuje elementów wyposażenia wnętrza, takich jak szafka, biurka, krzesła etc. Na życzenie klienta przedstawimy wycenę obejmującą kompleksowe wyposażenie.

* Cena zestawu zawiera wszelkie elementy niezbędne do połączenia i obróbki kontenerów, nie zawiera przyłączenia kontenerów do mediów zewnętrznych i przygotowania terenu.

* Cena montażu obejmuje wykonanie połączeń, uszczelnień oraz obróbek kontenerów.

Czas realizacji: 2 tygodnie

Warunki płatności: 30% przy złożeniu zamówienia i 70% przed dostawą kontenerów

Gwarancja: 12 m-cy

Oferta jest ważna do dnia 06.04.2018 r.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.


Zapraszam do zapoznania się z ofertą i kontaktu!

Z poważaniem
Maciej Działowski

www.boxtainer.pl biuro@boxtainer.pl
tel. +48 512 517 342, tel./fax: +48 58 322 09 07

Tenista Sp. z o.o. Sp. k. ul. Leszka Białego 21; 80-353 Gdańsk, Polska
NIP: PL 5842734515; REGON 221990342; KRS 0000486218; Bank PEKAO S.A. 62 1240 1271 1111 0010 6208 7529

Adres korespondencyjny:
Tenista Sp. z o.o. Sp. k. Domachowo 19; 83-041 Mierzeszyn

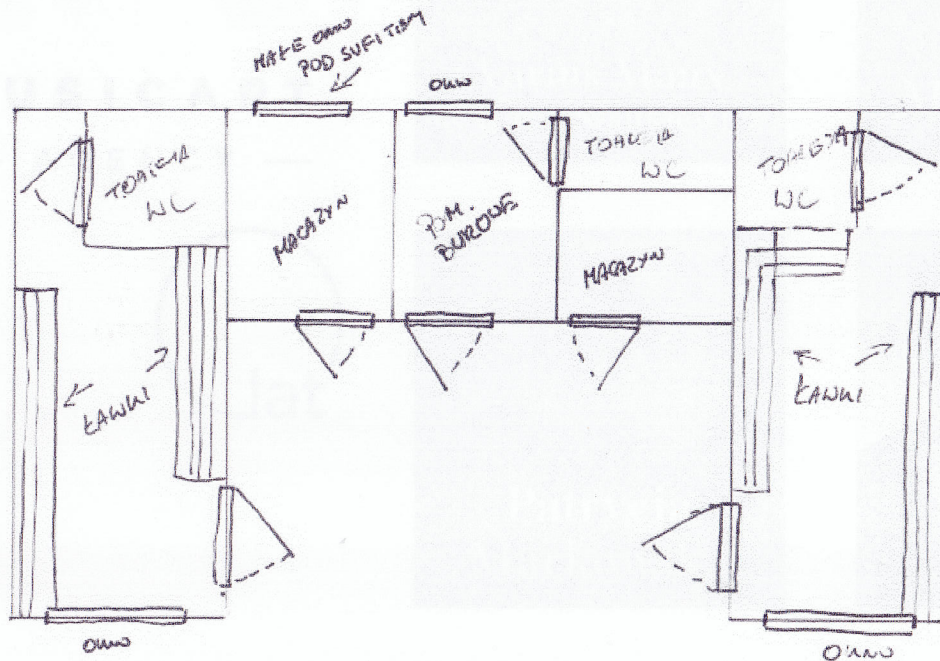

UKŁAD „U” TRZECH KONTENERÓW
* LEW ŁĘBORN *
POZDRAWIAM Piotr Gencwał
663630021

tel. +48 22 243 61 24

WWW

www.boxtainer.pl biuro@boxtainer.pl

tel. +48 512 517 342, tel./fax: +48 58 322 09 07

Tenistał Sp. z o.o. Sp. k. ul. Leszka Białego 21; 80-353 Gdańsk, Polska

NIP: PL 5842734515; REGON 221990342; KRS 0000486218; Bank PEKAO S.A. 62 1240 1271 1111 0010 6208 7529

Adres korespondencyjny:

Tenistał Sp. z o.o. Sp. k. Domachowo 19; 83-041 Mierzeszyn
